

# Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. **Michał Szczuka**  
ul. Okrężna 35, 47-440 Łęg  
tel.691 161 070

---

**INWESTOR:**

**Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jerzego w Sławikowie  
przy ul. Parkowej**

**TEMAT:**

**Program prac konserwatorskich zabezpieczenia  
i zachowania Kaplicy Bożego Ciała przy kościele  
parafialnym pw. św. Jerzego w Sławikowie**

**LOKALICACJA:**

**47-411 Sławików, działka nr 158  
jednostka ewidencyjna: 241108\_2 Rudnik  
obręb: 14 Sławików**

**OBIEKT:**

**Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.)**

**DATA:**

**Listopad 2023r.**

**AUTOR OPRACOWANIA:**

		<b>PODPIS:</b>
Opracował:	mgr inż. Michał Szczuka	

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki;  
odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji  
kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

### Spis treści

1. WSTĘP.....	2
2. KARTA TYTUŁOWA BUDYNKU .....	4
3. RYS HISTORYCZNY.....	4
4. RZUT OBIEKTU.....	4
5. OPIS OBIEKTU .....	5
6. STAN ZACHOWANIA POKRYCIA DACHU .....	6
7. STAN ZACHOWANIA KONSTRUKCJI DACHU .....	8
8. STAN ZACHOWANIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH .....	8
9. STAN ELEWACJI.....	10
10. STAN WNĘTRZA.....	10
11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	11
12 . WYMIANA POKRYCIA DACHU.....	12
13. RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.....	13
14. RENOWACJA ELEWACJI .....	13
15. RENOWACJA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH.....	13
16. ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE.....	14

## *PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH*

*– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie*

### **1. WSTĘP**

#### **Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane z planowanym osuszeniem ścian, remontem wnętrza-wymianą tynków wewnętrznych, remontem posadzki, odtworzeniem ołtarza, zagospodarowaniem obiektu. Celem programu jest przywrócenie dawnej funkcji kultowej.



*Fot. 1. Elewacja wschodnia*



*PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH*

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki;  
odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji  
kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie  
*Fot. 2. Elewacja północna*



*Fot. 3. Elewacja południowa*



*Fot. 4. Elewacja zachodnia*

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki;  
odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji  
kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

### 2. KARTA TYTUŁOWA BUDYNKU

Miejscowość: 47-411 Sławików

powiat raciborski, gmina Rudnik

działka nr 158

jednostka ewidencyjna: 241108\_2 Rudnik

obręb: 14 Sławików


#### określenie zabytku:

Kaplica Bożego Ciała (PN.ZACH.) znajduje się w obrębie miejscowości Sławików wpisanego do rejestru zabytków pod nr Op.-616/66

### 3. RYS HISTORYCZNY

Nowy, wzniesiony l. 1843-44 neoromański kościół w Sławikowie, powstał z inicjatywy księdza Antona Krause, który urząd proboszcza w Sławikowie pełnił w l. 182-1880. Za jego czasów, w 2 poł. XIX w., wzniesiono także klasycystyczne kaplice, używane do nabożeństw na święto Bożego Ciała.

### 4. RZUT OBIEKTU

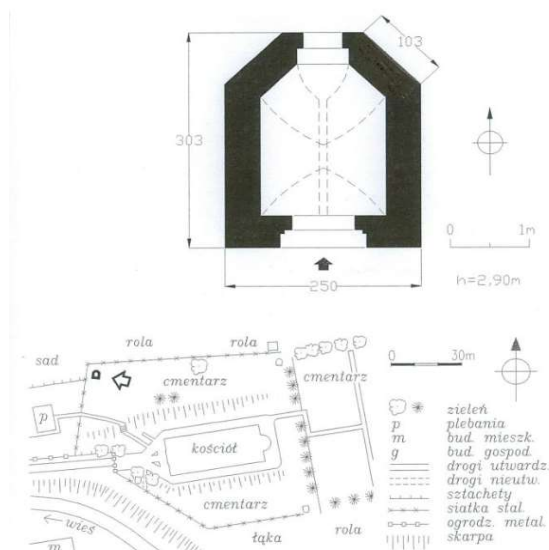

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie  
Rzut Kaplicy Bożego Ciała (PN.-ZACH.)

### 5. OPIS OBIEKTU

Kaplica jest jedną z czterech, znajdujących się na terenie posesji kościoła parafialnego pw. św. Jerzego. Posesja kościelna znajduje się na wzniesieniu ponad wsią, po pn. stronie drogi ku Lasakom. Jej nieregularny kształt określa współczesne ogrodzenie z siatki metalowej, z bramą i furtkami zach. Dojazd na teren kościelny stanowi krótka droga z płyt betonowych, łącząca się z drogą przelotową. Kościół zajmuje centralną część parceli, wokół budowli rozciąga się stary cmentarz parafialny. Współcześnie teren kościelny przedłużono ku wsch., powiększając obszar cmentarza. Kapliczki zlokalizowano w narożach pierwotnej parceli kościelnej, oddzielonej szpalerem drzew od nowej części cmentarza. Opisywana budowla zajmuje narożnik pd.-zach. Usytuowana jest w pobliżu bramy kościelnej, przy betonowym obejściu, zwraca się ku niemu elewacją frontową. Od pd. budynek sąsiaduje z ogrodzeniem z siatki, za którym stroma skarpa, opadająca ku szosie; na wprost elewacji wsch. rozciąga się teren starego cmentarza parafialnego.

**Ściany.** Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, obustronnie tynkowane, detal architektoniczny murowany, tynkowany (gzyms wieńczący) i wyrabiany w rynku (dekoracja ramowa szczytu) oraz kamienny (dwa obeliski w dachu kaplicy), zachowany oryginalny gzyms wieńczący w elewacji frontowej, profilowany wygierowany w formie głowic nie zachowanych pilastrów.

**Elewacja pd. - frontowa** - jednoosiowa, gładka ściana, przepruta półkoliście zamkniętym osiowym otworem drzwiowym; zwieńczona trójkątnym szczytem, oddzielonym prostym, pasowym (nieoryginalny) gzymsem; w tympanonie, na osi szczytu półkoliście zamknięta nisza, ujęta w opaskowe obramienie, w której figura Ewangelisty Mateusza: szczyt z dekoracją ramową, osłonięty szerokim okapem płatwiowym dachu.

**Elewacje zach. i wsch.** - gładko tynkowane, ślepe ściany pozbawione jakichkolwiek elementów artykulacyjnych, czy dekoracyjnych, zwieńczone szerokim okapem krokwiowym.

**Elewacja pn.** - ukształtowana trójbocznie; boczne ściany ślepe i gładkie, środkowa przepruta osiowym, pełnołukowo zamkniętym, smukłym otworem okiennym z prostym podokiennikiem, który stanowi jedyny element podziału ściany: całość wieńczy szeroki okap dachowy.

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

**Sklepienia i stropy.** Jednoprzestrzenne wnętrze nakryte ceramicznym, tynkowanym sklepieniem kolebkowym o przekroju ostrołukowym, z lunetą nad otworem okiennym; szwy sklepienne akcentowane delikatnym profilowaniem w tynku.

**Więźba dachowa.** Więźba dachowa drewniana, niedostępna; konstrukcja płatwiowo-krokwiowa, z wypuszczonymi na zewnątrz, dekoracyjnie zaciosanymi końcami krokwi i płatwi.

**Pokrycie dachowe.** Dach kryty współcześnie dachówka bitumiczną.

**Posadzki i podłogi.** Posadzka betonowa, mocno zniszczona.

**Otwory.** Otwory okienne. Wnętrze kapliczki oświetlone jednym okienkiem, umieszczonym na osi środkowej elewacji pd: mały otwór w kształcie prostokąta stojącego zamkniętego pełnym łukiem, okno drewniane krosnowe, stale.

Otwory drzwi zewnętrzne: Główne i jedyne wejście zlokalizowano na osi elewacji frontowej, pn.: otwór prostokątny, o przysadzistych proporcjach, szeroki, z prostym zamknięciem (w odróżnieniu od pozostałych kaplic); drzwi 2-skrzydłowe drewniane, ramowo-płycinowe, przeszklone w górnych płycinach.

**Rzut.** Mała budowla założona na rzucie prostokąta o krępych proporcjach, z osią podłużną w kierunku pn.- pd. trójbocznym zamknięciem pd. Oś podłużną kaplicy i symetrię układu podkreślają otwory okienny pd. i wejściowy, pn.

**Bryła.** Mała budowla o prostej kubicznej, nierozczłonkowanej bryle, nakryte dachem 2-spadowym o małym kącie nachylenia połąci, z szerokim okapem krokwiowym i płatwiowym. Nad trójbocznym zamknięciem pd. dach przechodzi w wielopołaciowy. Elewacja frontowa zwieńczona trójkątnym szczykiem. Jedyne urozmaicenie bryły stanowią dwa kamienne obeliski, wyrastające symetrycznie z połąci dachowych nad elewacją frontową.

**Wnętrze.** Mała jednonętrzowa, sklepiona kaplica, z osią podłużną podkreślona wejściem, ołtarzem i otworem okiennym.

**Wyposażenie.** We wnętrzu zachowane resztki małej sarkofagowej mensy ołtarzowej murowanej z cegły i tynkowanej; ściany powyżej wys. 150 cm z resztkami polichromowanej dekoracji ornamentalnej. W niszy szczytu elewacji frontowej, figura Ewangelisty Mateusza z aniołem.

**Instalacje.** Budowla nie jest wyposażona w jakąkolwiek instalację.

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

### 6. STAN ZACHOWANIA POKRYCIA DACHU

Istniejące pokrycie dachu z dachówki bitumicznej wykazuje duży stopień zużycia oraz destrukcji. Występują liczne ubytki oraz spękania dachówek. Część dachówek jest wysunięta oraz spękana.



*Destrukcja pokrycia dachu, widoczne luźne elementy, spękania dachówek bitumicznych oraz ubytki. Uszkodzone opierzenie wokół obelisku. Destrukcja oraz ubytki tynku na obelisku. Częściowo zapadnięta połącz dachu wokół obelisku, spowodowana działaniem wilgoci*





## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

Destrukcja pokrycia dachu, widoczne luźne elementy, spękania dachówek bitumicznych oraz ubytki. Uszkodzone opierzenie wokół obelisku. Destrukcja oraz ubytki tynku na obelisku. Częściowo zapadnięta połać dachu wokół obelisku, spowodowana działaniem wilgoci



*Miejsce ubytki tynku w obeliskach.*

### **7. STAN ZACHOWANIA KONSTRUKCJI DACHU**

Zauważono zawilgocenie konstrukcji dachu oraz miejscowe zapadnięcie połaci. Uszkodzenia te spowodowane są nieszczelnościami obróbek dekarских wokół obelisku

### **8. STAN ZACHOWANIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

Drzwi drewniane (zbijane z desek), jednoskrzydłowe, o wykroju prostokąta zamkniętego łukiem, z nadświetlem.

Poddano ocenie stan zachowania stolarki drzwiowej

Na podstawie oceny stanu zachowania stwierdzono, że kwalifikują się do renowacji.

## *PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH*

*– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie*

Stolarka drzwiowa jest w stanie średnim, stwierdzono następujące typy zniszczeń:

Powłoki zabezpieczające drewno od strony zewnętrznej, na skutek szkodliwego oddziaływania dziennych i rocznych amplitud temperatury i wilgotności, są miejscowo spękane i odspojone oraz lokalnie wykruszone. Największe zniszczenia powłok stwierdzono w partii przyziemia. W miejscach ubytków powłok zabezpieczających występuje wietrzenie i biokorozja drewna.

Występują liczne uszkodzenia mechaniczne drewna, szczególnie w dolnej części drzwi. W partii przyziemia stwierdzono zniszczenia struktury drewna – uszkodzenia mechaniczne oraz dezintegracja struktury w miejscach długotrwałego zawilgocenia. Szklenie – występuje w górnej części – naświetle jest wypełnione szybami o chropowatej strukturze.



*Widok drzwi*

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie



*Widoczne miejsca uszkodzeń elementów drewnianych drzwi.*



*Widoczne miejsca uszkodzeń elementów drewnianych drzwi.*

## 9. STAN ELEWACJI

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- destrukcja tynku cokołu spowodowana zawilgoceniem,
- liczne odspojenia tynku
- widoczne zacieki na ścianie pod murłatami, spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego
- miejscowe zarysowanie ściany

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie



*Widoczne miejsca uszkodzeń elewacji.*

## 10. STAN WNETRZA

Istniejące tynki wykazują znaczny stopień zużycia oraz destrukcji. Występują liczne ubytki oraz spękania tynku. Na powierzchni tynku występują zabrudzenia, przebarwienia, zawilgocenia.



*Widoczne miejsca uszkodzeń wnętrza obiektu. Spękania oraz ubytki w tynku.  
Ślady zawilgocenia w dolnych partiach ścian.*

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie



*Widoczne miejsca uszkodzeń wnętrza obiektu. Spękania oraz ubytki w tynku.*

### 11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie powyższego opisu, a także przeprowadzonej oceny stanu technicznego – stwierdza się, iż elementy te wymagają zastosowania zdecydowanych kroków naprawczych.

### 12 . WYMIANA POKRYCIA DACHU

Przewidziany zakres robót:

- należy przywrócić pierwotny kształt dachu, poprzez skrócenie okapów po obrysie ścian kaplicy (ściany szczytowej oraz ścian bocznych)
- wymiana pokrycia dachu na całym obiekcie, wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem,
- wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów więźby dachowej (po rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego należy wezwać autora programu prac konserwatorskich w celu ustalenia ewentualnej wymiany lub naprawy elementów więźby)

Proponuje się wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej na rąbek stojący.

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

Szczegółowy zakres prac:

- rozbiórka istniejącego pokrycia dachu oraz deskowania
- rozbiórka obróbek blacharskich,
- skrócenie okapów, poprzez ich ścięcie do krawędzi ścian kaplicy,
- wymiana zniszczonych oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej
- wykonanie pełnego deskowania z desek o grubości 32mm (zaimpregnowanej przeciwko grzybom, insektom i p.poż do NRO)
- Mocowanie folii dachowej na deskowaniu
- Montaż rynien z blachy tytan-cynk 0,8mm i rur spustowych z blachy tytan - cynk 0,7mm
- Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych z blachy tytan-cynk gr 0,7mm
- Wykonanie pokrycia z stalowych powlekanych paneli na rąbek stojący. Montaż zgodnie z wytycznymi danego producenta.
- Montaż pozostałych elementów i prace towarzyszące wybranego systemu dekarckiego, typu: taśmy kalenicowe zabezpieczające - wentylacyjne; taśmy; grzebienie zabezpieczające; profile wentylacyjne do zabudowy w okapie; spinki; klamry;; kliny pomiędzy obróbką a pokryciem koszy; itp.

Kolor oraz rodzaj pokrycia dachu zostanie uzgodnione ze służbami konserwatorskimi.

### 13. RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH oraz OKNA

Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych oraz okna z zachowaniem wymiarów, kształtu oraz podziału istniejących drzwi i okna. Naświetle wyposażać w szkło. Rodzaj drewna: dąb. Okucia należy wykonać zbliżone do obecnych.

### 14. RENOWACJA ELEWACJI

Sposób przeprowadzenia naprawy ścian oraz sterczyn:

- wykonanie poziomej blokady hydrofobowej, metodą iniekcyjną, przy zastosowaniu aplikacjami kremami iniekcyjnymi
- Skucie luźnych oraz uszkodzonych tynków (minimum 0,5m od poziomu posadzki)

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie

- Odgrzybienie i odsolenie lica powierzchni ścian
- Nałożenie warstwy szczepnej będącej sztywnym mineralnym szlamem uszczelniającym o wysokiej odporności na siarczany, wzmacniającej podłoże do stosowania w systemie renowacji starego budownictwa do wysokości ok. 0,5m od poziomu posadzki
- Nałożenie przeciwwilgociowej warstwy ochronnej mineralno – bitumicznej grubości 3mm, będącej podłożem pod tynki renowacyjne
- Zastosowanie tynków renowacyjnych w rozwiązaniu systemowym
- Malowanie farbami krzemianowymi o współczynniku oporu dyfuzyjnego  $S_d < 0,08$

Odtworzenie malowań zostanie uzgodnione ze służbami konserwatorskimi.

### 15. RENOWACJA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

Sposób przeprowadzenia naprawy:

- Wykonanie inwentaryzacji zdobień,
- Skucie luźnych oraz uszkodzonych tynków (minimum 0,5m od poziomu posadzki)
- Odgrzybienie i odsolenie lica powierzchni ścian
- Oczyszczenie ścian,
- wykonanie poziomej blokady hydrofobowej, metodą iniekcijną, przy zastosowaniu aplikacjami kremami iniekcijnymi
- Nałożenie warstwy szczepnej będącej sztywnym mineralnym szlamem uszczelniającym o wysokiej odporności na siarczany, wzmacniającej podłoże do stosowania w systemie renowacji starego budownictwa
- Nałożenie przeciwwilgociowej warstwy ochronnej mineralno – bitumicznej grubości 3mm, będącej podłożem pod tynki renowacyjne do wysokości ok. 0,5m od poziomu posadzki
- Zastosowanie tynków renowacyjnych w rozwiązaniu systemowym
- Malowanie farbami krzemianowymi o współczynniku oporu dyfuzyjnego  $S_d < 0,08$
- Odtworzenie malowań zostanie uzgodnione ze służbami konserwatorskimi.

## *PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH*

*– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie*

### **16. ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE**

- 1) Opracowanie niniejsze nie może być opublikowane w całości lub w części bez zgody autorów i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- 2) Nie można opracowania wykorzystać do innych celów niż określone w opracowaniu.
- 3) Autorzy programu prac konserwatorskich nie mogą odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie przeprowadzonych wizji lokalnych.
- 4) Zakres robót remontowo – naprawczych oraz rozwiązania technologiczno – materiałowe należy uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków, a wzmiankowane roboty należy przeprowadzić zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
- 5) W przypadku powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania oraz wykonywania robót remontowych, należy zwrócić się do autora opracowania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
- 6) Ze względu na dynamizm czynników destrukcyjnych oddziałujących na obiekt, ważność niniejszego opracowania określa się na maksimum 12 miesięcy.



## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

– osuszenie ścian; remont wnętrza- wymiana tynków wewnętrznych, remont posadzki; odtworzenie ołtarza; zagospodarowanie obiektu, przywrócenie mu dawnej funkcji kultowej - Kaplica Bożego Ciała (PN.-ZACH.) w Sławikowie



Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Michał Szczuka**

mgr inż. budownictwa  
ur. dnia 30 marca 1984 w Raciborzu

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny SLK/4727/OWOK/13  
do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

### UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Michał Szczuka  
Okrężna 35  
47-440 Łęg
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
